Onderhoudsplan wegen 2014 - 2023
Gemeente Schiermonnikoog

Wanneer?	#	Straatnaam	Lengte	Breedte	Oppervlakte	Volledig herinrichten	Herstraten	Gedeeltelijk herstraten		Advies InVra Plus	prijs incl. 10% onvoorzien / 20% eilandertoeslag	Opmerking
			m	m	m2	€ 50 / m2	€ 30 / m2	€ 17,50 / m2				
		Straatwerk										
2014	Q	Karelspad	77	4,20	323	€ 16.170	€ 9.702	€ 5.660		€ 16.170,00	€ 21.021,00	Busroute
	R	Langestreek west	27	4,20	113	€ 5.670	€ 3.402	€ 1.985		€ 5.670,00	€ 7.371,00	Busroute
	S	Nieuwestreek	135	5,70	770	€ 38.475	€ 23.085	€ 13.466		€ 38.475,00	€ 50.017,50	Busroute
		voetpad Badweg (penetratielaag)	800	1,25	1000			€ 30 per m2		€ 30.000	€ 39.000	
2015	K	Tuntelerstraat	108	5,00	540	€ 27.000	€ 16.200	€ 9.450		€ 9.450,00	€ 12.285,00	Woonerf
	M	Gratia Susannestraat	137	4,60	630	€ 31.510	€ 18.906	€ 11.029		€ 11.028,50	€ 14.337,05	Woonerf
	N	Stachouwerstraat	101	4,70	475	€ 23.735	€ 14.241	€ 8.307		€ 8.307,25	€ 10.799,43	Woonerf
	O	Pathmosstraat	44	3,70	163	€ 8.140	€ 4.884	€ 2.849		€ 2.849,00	€ 3.703,70	Woonerf
		Pathmosstraat	52	5,00	260	€ 13.000	€ 7.800	€ 4.550		€ 4.550,00	€ 5.915,00	Woonerf
2016	D	Willem Dijkstraat	100	4,40	440	€ 22.000	€ 13.200	€ 7.700		€ 13.200,00	€ 17.160,00	Erfontsluiting
		Willem Dijkstraat	80	5,00	400	€ 20.000	€ 12.000	€ 7.000		€ 12.000,00	€ 15.600,00	Erfontsluiting
	E	Hazeblom	54	4,80	259	€ 12.960	€ 7.776	€ 4.536		€ 4.536,00	€ 5.896,80	Woonerf
	F	Gasaustraat	224	5,20	1165	€ 58.240	€ 34.944	€ 20.384		€ 34.944,00	€ 45.427,20	Erfontsluiting
2017	B	Sinteblom	46	4,50	207	€ 10.350	€ 6.210	€ 3.623		€ 3.622,50	€ 4.709,25	Woonerf
	C	Buterblom	67	4,50	302	€ 15.075	€ 9.045	€ 5.276		€ 5.276,25	€ 6.859,13	Woonerf
		Buterblom	72	3,20	230	€ 11.520	€ 6.912	€ 4.032		€ 4.032,00	€ 5.241,60	Woonerf
	G	Kantjeblom	70	5,50	385	€ 19.250	€ 11.550	€ 6.738		€ 6.737,50	€ 8.758,75	Woonerf
	T	Molendijk	120	3,70	444	€ 22.200	€ 13.320	€ 7.770		€ 13.320,00	€ 17.316,00	Erfontsluiting
2018	A	Oosterreeweg	500	6,00	3000	€ 150.000	€ 90.000	€ 52.500		€ 150.000,00	€ 195.000,00	Busroute
	P	Langestreek oost	75	4,50	338	€ 16.875	€ 10.125	€ 5.906		€ 16.875,00	€ 21.937,50	Busroute
2019	H	Paaslandweg	124	4,50	558	€ 27.900	€ 16.740	€ 9.765		€ 16.740,00	€ 21.762,00	Erfontsluiting
	I	Burgemeester v/d Bergstraat	206	5,50	1133	€ 56.650	€ 33.990	€ 19.828		€ 33.990,00	€ 44.187,00	Erfontsluiting
2020	J	Burgemeester v/d Wormstraat	191	4,60	879	€ 43.930	€ 26.358	€ 15.376		€ 26.358,00	€ 34.265,40	Erfontsluiting
	L	Van Starkenborgstraat	200	4,70	940	€ 47.000	€ 28.200	€ 16.450		€ 28.200,00	€ 36.660,00	Erfontsluiting
								Totaal straatwerk:		€ 305.151	**€ 645.230**	

Wanneer?	#	Straatnaam	Lengte	Breedte	Oppervlakte					Advies InVra Plus	prijs incl. 10% onvoorzien / 20% eilandertoeslag	Opmerking
		Asfaltverharding										
2022		Veerweg	270	5,00	1350			€ 15.750		€ 15.750	€ 20.475	
		Heereweg	2200	5,20	11440			€ 133.467		€ 133.467	€ 173.507	
		Prins Bernhardweg	2200	3,50	7700			€ 89.833		€ 89.833	€ 116.783	
								Totaal asfaltverharding:		€ 239.050	**€ 310.765**	
								Totaal		€ 544.201	**€ 955.995**	

Opgesteld door: H. Groot
Gecontroleerd door: N. Kruyt

Onderhoudsplan wegen 2014 - 2023
Gemeente Schiermonnikoog

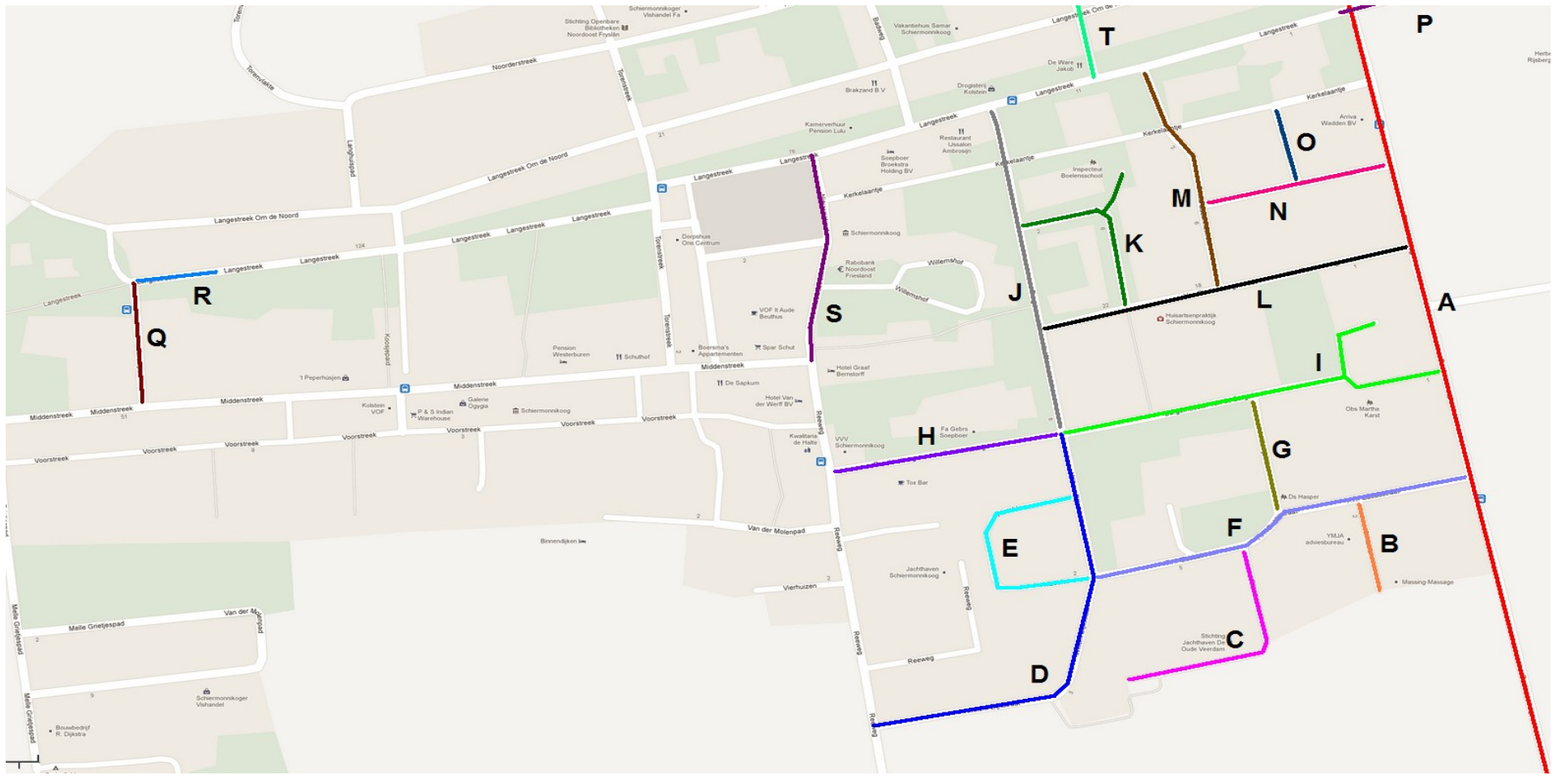

Opgesteld door: H. Groot
Gecontroleerd door: N. Kruyt
